



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

BKF/K-68/2014

1055/3-²⁰¹⁵2014/1024

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

valamint

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

között

2015. 07-30



BUDAPESTI
KÖZLEKEDÉSI
KÖZPONT

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

(a továbbiakban: „**1. sz. Módosítás**”), amely létrejött egyrészről a

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Cégjegyzékszám: 01-10-046840
Adószám: 23028966-4-44
Csoportazonosító szám: 17781372-5-44
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”)

másrészről a

SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-897738
Adószám: 14300327-2-44
mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”)

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „**Felek**”, külön-külön a „**Fél**”) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1. ELŐZMÉNYEK, MÓDOSÍTÁS INDOKA

- 1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) 121. § (1) bekezdés b) pontja szerint, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le a „**Budapest, 2014. évi útfelújítási program kivitelezési munkái, III. ütem**” tárgyban.
- 1.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében az eljárás nyertese Vállalkozó lett, amelyre tekintettel Felek 2015. január 26. napján, 1055/3-403/2014/1024. iktatószám alatt, a „**Budapest XII. kerület, Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca), Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) és Határőr utca (Goldmark Károly utca – Ráth György utca) kivitelezési munkái**” tárgyában vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „**Szerződés**”) kötöttek egymással.
- 1.3. Felek a Szerződést kölcsönösen egyező akaratúval a jelen 1. sz. Módosítás szerint kívánják módosítani, oly módon, hogy a jelen 1. sz. Módosításban megjelölt rendelkezések a Szerződés megfelelő rendelkezéseinek a helyébe lépnek, míg a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 1.4. Felek megállapítják, hogy a Szerződés teljesítése során felmerült, és alább részletezett körülményekre tekintettel a Szerződés módosítása vált szükségessé:

Felek rögzítik, hogy a Főgáz Földgázelosztási Kft. (a továbbiakban: „**Főgáz Kft.**”) 2015. március 17. napján kelt közműnyilatkozata és a 2015. május 6. napján kelt levele értelmében az útfelújítással érintett útszakaszon az üzemelő gázvezetékek műszaki állapotvizsgálata megtörtént, és megállapításra került, hogy a Határőr utcai vezetékek állapota, és kora alapján a gázvezetékek rekonstrukciója indokolt és elengedhetetlen, amelynek elvégzésére 2015. III. negyedévében kerül sor.

Fentiek figyelembevételével a Szerződés szerinti munkakezdés és az útfelújítási munkák Szerződés szerinti határidőben történő elvégzése a Határőr utca teljes szakaszán az útfelújítás során kiépített új aszfaltburkolat Főgáz Kft. általi újbóli felbontását jelentené rövid időn belül. Tekintettel arra, hogy a Főgáz Kft. korábbi nyilatkozatában foglaltak miatt sem Megrendelő, sem Vállalkozó nem számolhatott előre a Szerződés szerinti munkaterületet érintő rekonstrukciós munkák elvégzésével, a bontási munkák duplikációjának elkerülése, a kivitelezések ésszerű összehangolása, valamint a Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése érdekében szükséges a Goldmark Károly utca és a Tóth Lőrinc utcai útszakaszoktól (1. részteljesítés) a Határőr utcai útszakaszt (2. részteljesítés) elkülönítetten kezelni.

Tekintettel arra, hogy a Határőr utcai útszakasz vonatkozásában a munkaterület átadás-átvétele az eredeti szerződéses határidővel nem biztosítható, erre az útszakaszra vonatkozóan új teljesítési határidő tűzése vált szükségessé. A Határőr utcai útszakaszon elvégzendő Munka teljesítési határidejének módosulása következtében az eredeti egy műszaki átadás-átvételi eljárás helyett kettő lesz, ezáltal a számlázásra vonatkozó rendelkezések is módosulnak.

A Szerződés gazdasági egyensúlyának, valamint jogszerűségének fenntartása végett Felek a teljesítési, illetve hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékokra vonatkozó szabályokon is módosítani kívánnak, mégpedig úgy, hogy Vállalkozó jogosult legyen a teljesítési biztosíték egyes részteljesítésekre eső arányos részének hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékokra történő átforgatására.

A fenti módosítás okán a Szerződés 3. számú, illetve 4. számú mellékletének aktualizálása is szükségessé vált.

- 1.5. A fentiek alapján Felek álláspontja szerint a kialakult helyzet a Felek lényeges jogos érdekét sérti, amely a Felek által előre nem látható, és Feleknek fel nem róható körülmények miatt merült fel, erre tekintettel fennállnak a Kbt. 132. §-ban foglalt, a Szerződés módosítására lehetőséget adó feltételek.

2. A MÓDOSÍTÁS TARTALMA

- 2.1. A jelen 1. sz. Módosítás 1.3. és 1.4. pontja értelmében a Felek kölcsönös megegyezése alapján a Szerződés 3., 3.1., 3.2., 7.4., 9.2., 12.1., 13.8., valamint a 13.12. pontját az alábbiak szerint módosítják akképp, hogy a Szerződés 3.1. pontja helyébe új rendelkezés lép, és az eredeti 3.1. pont helyébe a 3.2. pont, míg az eredeti 3.2. pont helyébe a 3.3. lép:

„3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE

3.1. *Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Munkát kettő (2) részfeladat keretében teljesíti. Az első részfeladat a Goldmark Károly utca és a Tóth Lőrinc utcai útszakaszokat, míg a második részfeladat a Határőr utcai útszakaszt foglalja magában.*

3.2. Felek megállapodnak *továbbá* abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát *a Goldmark Károly utca és a Tóth Lőrinc utcai útszakaszok vonatkozásában* 2015. július 31. napjáig, *míg a Határőr utcai útszakasz vonatkozásában a munkaterület átadásától számított 60. napig teljesíteni.*

3.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben *mind a Goldmark Károly utca és Tóth Lőrinc utcai útszakaszok vonatkozásába, mind a Határőr utcai útszakasz vonatkozásában* az adott részteljesítésre vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel”) megkezdéséig, azaz a Szerződés 3.1. pontjában írt *határidőig* a Vállalkozó a Munkát készre jelentette a 12. pont szerint (a

továbbiakban: „Készre jelentés”), továbbá a Műszaki átadás-átvételhez szükséges – Szerződés 12. fejezetében pontjában meghatározott - dokumentumokat Megrendelő rendelkezésére bocsátotta és az adott részteljesítésre vonatkozó Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődött.”

„7.4. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott Építési naplóban kell rögzíteni. Megrendelő **a Goldmark Károly utcai, valamint a Tóth Lőrinc utcai útszakaszok (1. részteljesítés) vonatkozásában** a munkaterületet legkésőbb 2015. március 16. napjáig átadja Vállalkozó részére, azonban Vállalkozó kérésére a munkaterület átadására ennél korábbi időpontban is sor kerülhet. **A Határőr utcai útszakasz (2. részteljesítés) tekintetében a munkaterület átadására a Főgáz Kft. által végzett rekonstrukciós munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követő öt (5) munkanapon belül kerül sor, azzal, hogy amennyiben a munkaterület átadása a Felektől független körülmények miatt 2015. szeptember 21. napjáig nem történik meg – figyelemmel a munkák jellegére, valamint a szerződésszerű teljesítés téli üzemeltetési időszak (november 15 - március 15.) előtti befejezését ellehetetlenítő körülményekre – Megrendelő a munkaterületet legkésőbb 2016. március 16. napjáig adja át Vállalkozó részére.** Vállalkozó köteles a felajánlott rész-munkaterület átvételére is. A **munkák** megkezdésére kizárólag a munkakezdeti hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, melynek beszerzése Vállalkozó feladata.”

„9.2. A Megrendelő a Munka elvégzését négy (4) ütemben számolja el, ennek megfelelően a Vállalkozó - az esetleges előlegről szóló számlán túl – négy (4) db számla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

9.2.1. A Munka Műszaki ellenőr és Megrendelő által felmérés alapján igazolt legalább 25%-os műszaki készültsége esetén, tervezetten a **teljes** nettó Vállalkozói díj 25 %-a,

9.2.2. A Munka Műszaki ellenőr és Megrendelő által **felmérés alapján** igazolt legalább 50%-os műszaki készültsége esetén, tervezetten a **teljes** nettó Vállalkozói díj 25 %-a,

9.2.3. **A Goldmark Károly és a Tóth Lőrinc utcai útszakaszok** Műszaki ellenőr és Megrendelő által **felmérés alapján** igazolt **100%-os** műszaki készültsége esetén **az érintett útszakaszokra eső nettó Vállalkozói díj fennmaradó része,**

9.2.4. **A Határőr utcai útszakasz** Műszaki ellenőr és Megrendelő által **felmérés alapján** igazolt **100%-os** műszaki készültsége esetén **az adott útszakaszra eső nettó Vállalkozói díj 100%-a.”**

„12.1. **Felek rögzítik, hogy a Szerződés 3.1. pontjára tekintettel kettő műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására kötelesek.** A Készre jelentés során a Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel, hogy a Munkát maradéktalanul teljesítette. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőr tűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját.”

„13.8. A Teljesítési biztosítéknak a Szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően az utolsó sikeres Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell érvényben lennie, azzal, hogy a Vállalkozó jogosult az első részteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásnak lezárását követően a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában a Teljesítési biztosíték összegét arányosan csökkenteni az átvett részteljesítésre eső – áfa és tartalékkeret nélkül számított – nettó ellenszolgáltatás összege 5 %-ával.”

„13.12. Vállalkozó a Kbt. 126. § (4) bekezdés alapján köteles a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: „Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték”) a Megrendelő rendelkezésére bocsátani az első részteljesítés esetében az első részteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásnak lezárását követően a teljesítésigazolás kiállításának időpontjában, míg az utolsó részteljesítés esetén az utolsó részteljesítés sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárását követően az arra vonatkozó teljesítésigazolás kiállításának időpontjában, a jótállás teljes időtartamára.

A Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 126. § (3) bekezdése alapján az első részteljesítésre, valamint az utolsó részteljesítésre – áfa és Tartalékkeret nélkül számított – vonatkozó nettó ellenszolgáltatás összege 5%-a, amely együttesen kiadja a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeget.”


- 2.2. Felek kölcsönösen egyező akarattal megállapodnak abban, hogy jelen 1. sz. Módosítás 1. számú, illetve 2. számú melléklete a Szerződés 3. számú, illetve 4. számú melléklete helyébe lép.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


- 3.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen 1. sz. Módosítással nem érintett rendelkezései, valamint mellékletei változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 3.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 1. sz. Módosítással kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezései az irányadóak.


Felek kijelentik, hogy a jelen 1. sz. Módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen – három (3) számozott oldalból álló – öt (5) db magyar nyelvű eredeti példányt - amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig, Vállalkozót illet - jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. 09. 30.



Nyul Zoltán
igazgató



BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megrendelő




Horváth János
vezérigazgató-
helyettes




Boncz Zoltán
területi
főmérnök



Swietelsky Magyarország Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vállalkozó




Kovácsné Szlama Gitta
területi gazdasági
vezető


Dr. Olajos Orsolya
09.15. 


dr. Pozsgai



dr. Szüle Orsolya
09.15. 


Martal István
09.21. 


Edgár Zoltán


4
BE



0000051154

Garanciaszám: FIIN002315WGIF
 Garancia nyilvántartási száma: MD1501600005
 Referens: Dankó Tamás
 OM / ST

BKK Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Budapest
 Rumbach Sebestyén utca 19-21.
 1075

Tárgy: teljesítési bankgarancia

Tudomásunk van arról, hogy a **Swietelsky Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégnév: Swietelsky Magyarország Kft., székhely/cím: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B épület V. emelet, a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-09-897738) (a továbbiakban: Megbízó) "**Budapest XII. kerület, Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca), Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) és Határőr utca (Goldmark Károly utca – Ráth György utca) kivitelezési munkái**" tárgyban szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötött Önökkel. Tudomással bírnak arról továbbá, hogy Önök a Szerződésben teljesítési bankgarancia rendelkezésre bocsátását is előírták.

A Megbízó megbízása alapján ezennel az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38., a cégjegyzék helye és száma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-040952). (továbbiakban: Bank) nevében teljesítési garanciát vállalunk az Önök javára

legfeljebb **5.716.442 Ft**
 azaz **Ötmillió-hétszázötvenháromezer-négyszáznegyvenkettő forint**

erejéig, az alábbiak szerint:


E bankgarancia-vállalás alapján a Bank feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy az Önök első írásbeli felszólítására (igénybevétel), az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a Bank vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére, az Önök javára az Önök által megjelölt összegben - legfeljebb azonban a jelen garancia fent megjelölt keretösszege erejéig - fizetést teljesít, amennyiben a Bank 1056 Budapest, Váci utca 38. címére küldött magyar nyelvű írásbeli felszólításukban úgy nyilatkoznak, hogy az Önök által követelt összeg azért vált esedékessé, mert a Megbízó a Szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesítette.

Az igénybejelentés az Önök számlavezető hitelintézetén keresztül nyújtandó be, a rajta szereplő cégszerű aláírás hitelességének igazolásával.

A jelen garanciából eredő fizetési kötelezettsége alapján Bankunk a felhívás kézhezvételétől számított legkésőbb 5 (öt) banki munkanapon belül intézkedik az összeg átutalása iránt az Önök által megadott bankszámlára.

(Folytatás a 2. oldalon!)

1/2

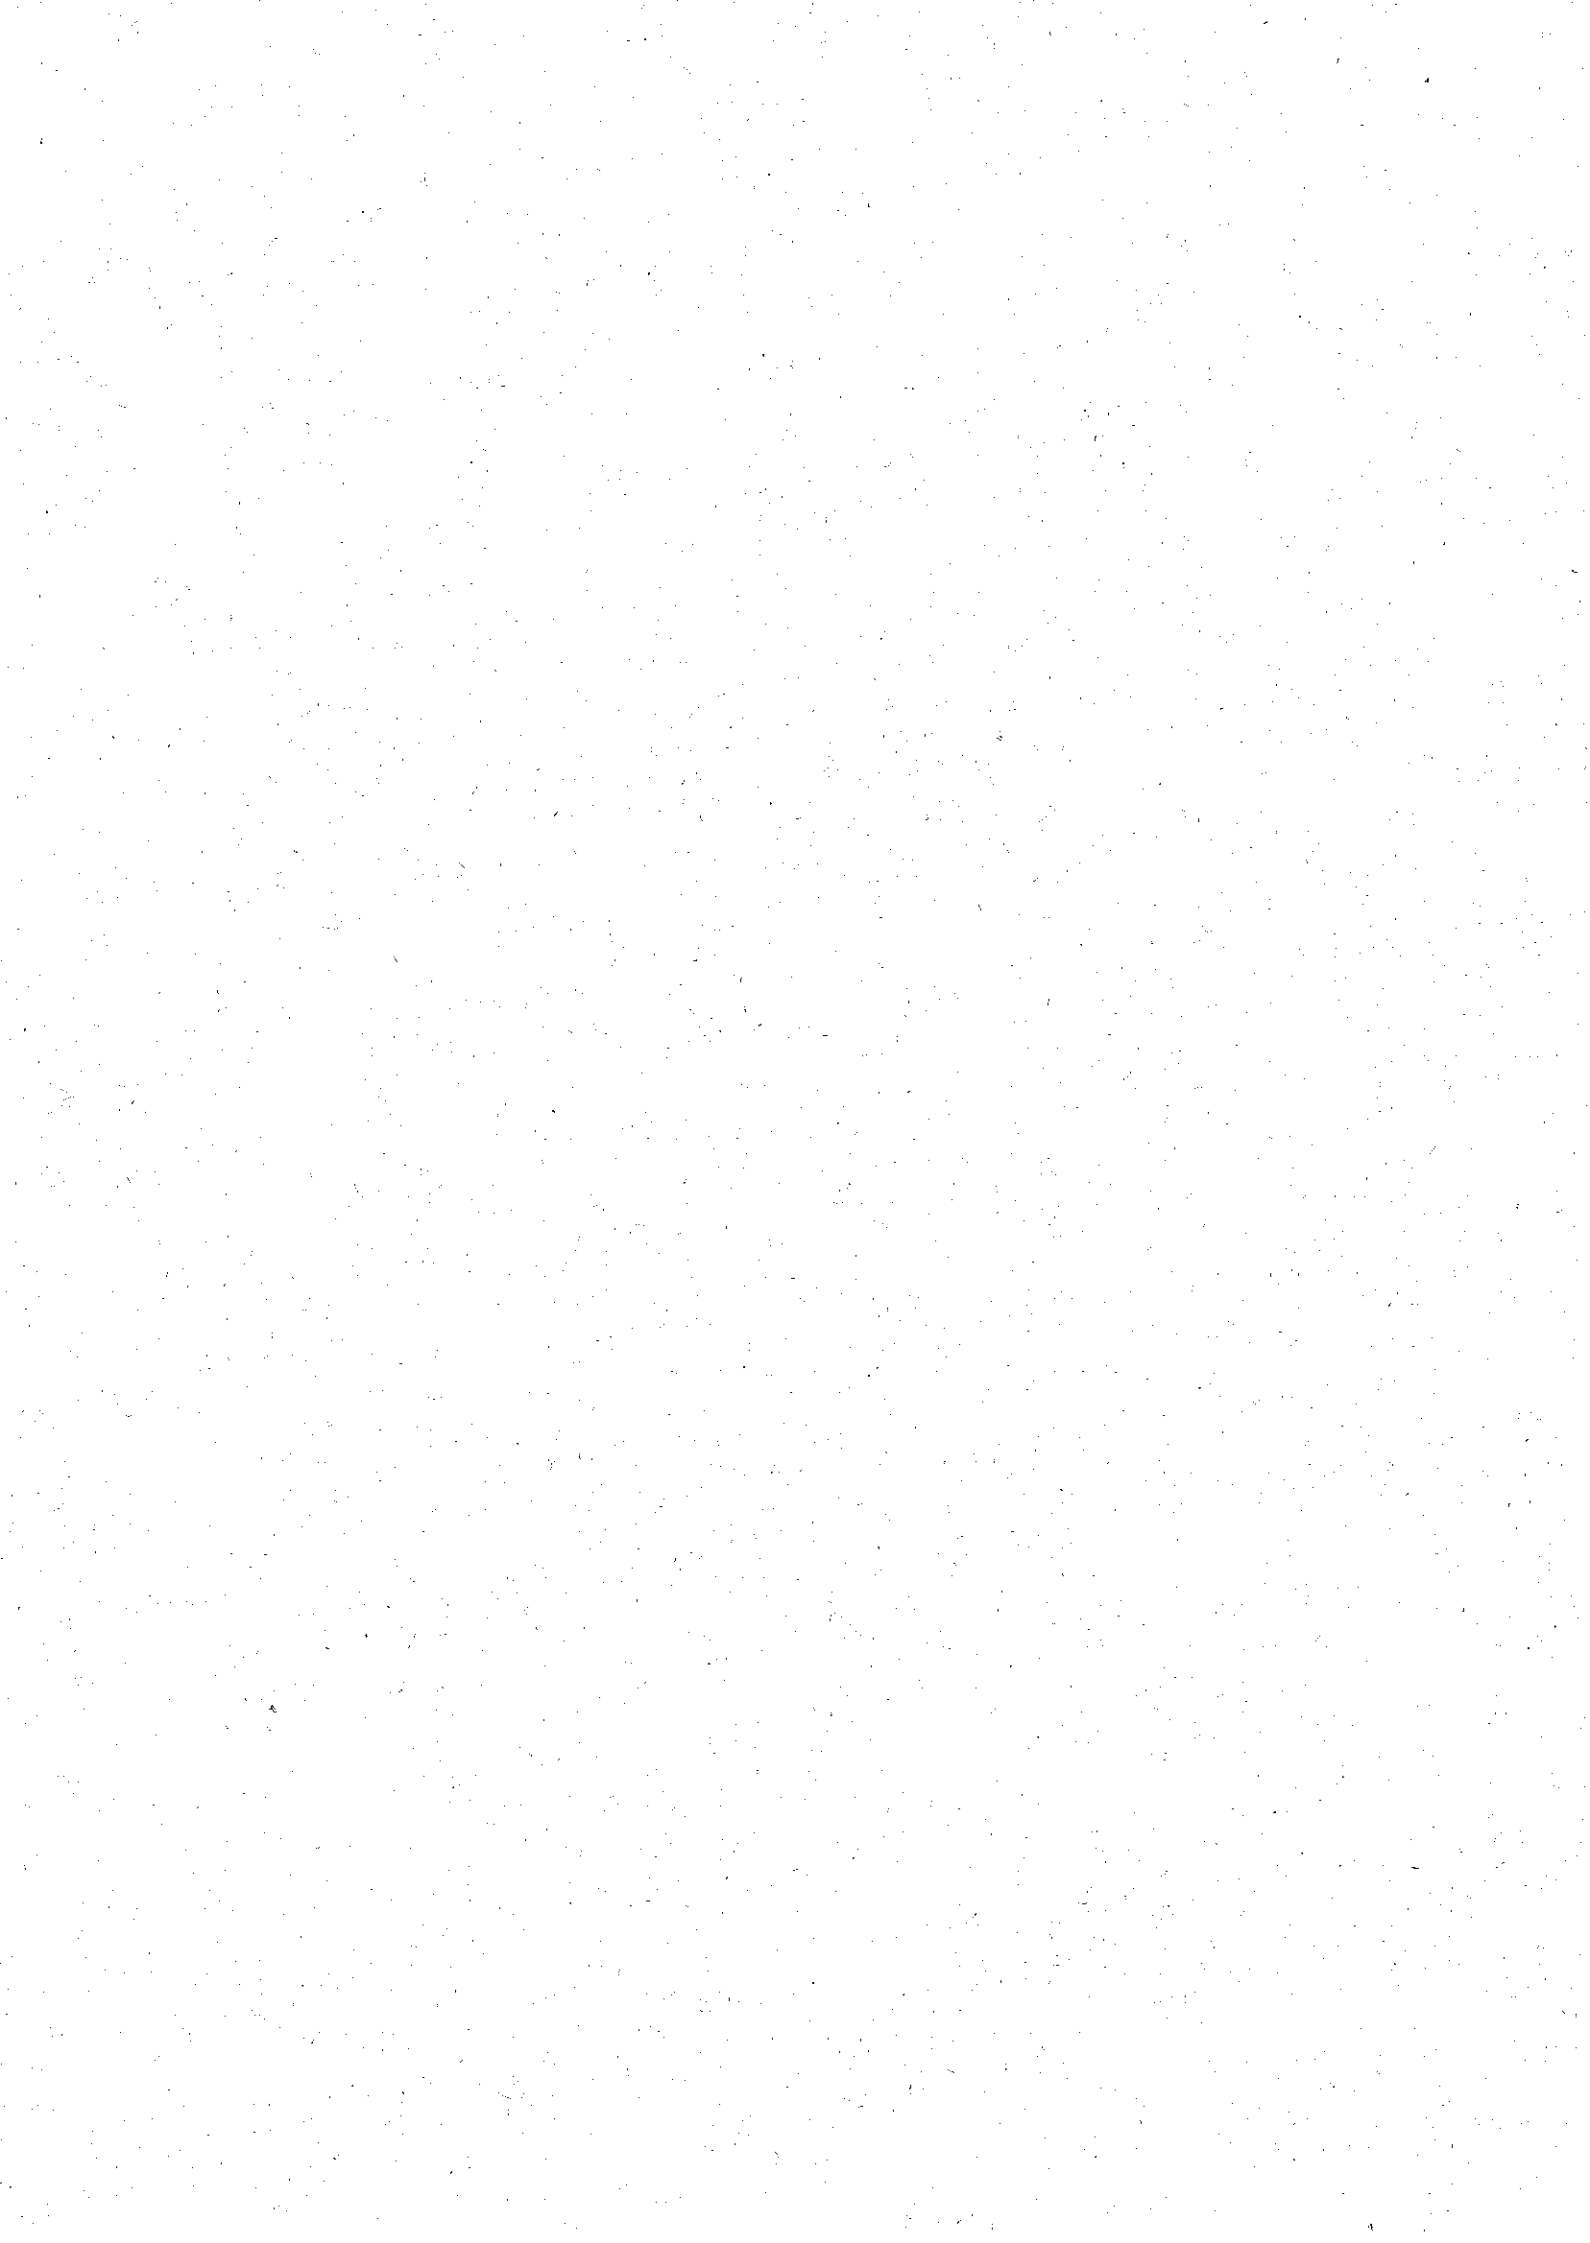

Garanciaszám: F11N002315WGIF

Jelen garancia keretösszege a garancia alapján teljesített kifizetésekkel automatikusan csökken.

Ezen garancia a kibocsátás napjától 2015. szeptember 14-ig marad hatályban.

A garancia igénybejelentésnek legkésőbb a lejárat napjának – ha e nap munkaszüneti vagy bankszünnap, úgy az ezt megelőző banki munkanap - 14 h-ig kell megérkeznie a Bankhoz.

Ezen időponton túl beérkezett igénybevételekre a Bank fizetést nem teljesít, a fenti időpontot követően a jelen bankgarancia minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan hatályát veszti, azaz annak alapján a Bankot fizetési kötelezettség nem terheli.

A garancia - a fent jelzett határnapot megelőzően is – megszűnik, ha Önök egy cégszerűen aláírt nyilatkozatban a jelen kötelezettségvállalásunk alól felszabadítják a Bankot.

A garanciából származó igények - a Bank előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedélyezhetők, nem ruházhatók át, nem zálogosíthatók el, és más módon sem köthetők le biztosítékul. Amennyiben Önök a Megbízóval abban állapodnak meg, hogy a Megbízó személyét a Szerződés módosításával megváltoztatják, a Bank a jelen bankgarancia alapján fizetést kizárólag abban az esetben teljesít, ha a Megbízó jogutódlásához a garancia megbízási szerződés és a jelen bankgarancia módosításával hozzájárul.


A garancia hivatalos nyelve a magyar nyelv.

A garanciára a magyar jog előírásai az irányadók.


Budapest, 2015. január 16.

MKB Bank Zrt. | 2

MKB Bank Zrt.



Dankó Tamás
senior szaktanácsadó



Masznicsek Judit
vállalati bankár



FEDEZETIGAZOLÁS

Ezen nyilatkozattal igazoljuk, hogy a SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20.) az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-nek partnere. Társaságunknál jelenleg 2014.04.01-2015.03.31-ig illetve a biztosítás szerződés felmondásának hiányában további egy évre teljes körű tevékenységi felelősségbiztosítással rendelkezik, amely a SWIETELSKY Magyarország Kft. teljes évi forgalmára fedezetet nyújt.

Kötvényszámok:

Tevékenységi felelősségbiztosítás 8 447 436 8

Limit: 1 000 000 EUR / kár és 3 000 000 EUR / év

Az előzőekben írt összegeket meghaladó károkra 15 000 000 EUR összeghatárig a nemzetközi program (Master Policy) nyújt fedezetet. Így az ajánlati felhívásban a CAR szakmai felelősségbiztosításra előírt legalább 20 000 000 HUF /kár és 100 000 000 HUF/év kárkifizetési limit összegű biztosítási fedezet fennáll. A biztosítás fedezetet nyújt az Ajánlattevő és valamennyi közreműködő alvállalkozó tevékenységére, mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is a projekt érdekében folytatott tevékenység tekintetében. A Megrendelő ilyen igénye esetén a fedezet kiterjeszhető a következményi károk megtérítésére is.

Szerződés megnevezése: „Budapest, XII. kerület, Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca), Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) és Határőr utca (Goldmark Károly utca – Ráth György utca)” kivitelezési munkái

Megbízó neve, címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.

Kivitelező: SWIETELSKY Magyarország Kft.
1117 Budapest, Irinyi József u. 4-20. B. ép. V. em.

Futamidő: 2015. január 20. – 2015. november 30.

Szerződött érték: 114.328.846,- Ft + ÁFA

A jelen fedezetigazolást a SWIETELSKY Magyarország Kft. kérésére az érintett projekthez történő felhasználás céljából adtuk ki.

A biztosítási fedezet tekintetében a kötvény, a vonatkozó biztosítási feltételek, valamint a nemzetközi program kondíciói az irányadóak. Konzorciumi munka esetében a biztosítási fedezet a SWIETELSKY Magyarország Kft. részesedésének mértékéig áll fenn.

UNION Vienna Insurance Group
Biztosító Zrt.

Budapest, 2015. január 15.


UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.



SZERZŐDÉS KÍSÉRŐLAP

Iktatási szám: 1055/3-~~2014~~²⁰¹⁵/2014/1024

Szerződés száma: BKF/

Szerződés tárgya (röviden, beazonosítható módon):

„Budapest XII. kerület, Goldmark Károly utca (Határőr út – Tóth Lőrinc utca), Tóth Lőrinc utca (Goldmark Károly utca – Istenhegyi út) és Határőr utca (Goldmark Károly utca – Ráth György utca) kivitelezési munkái” tárgyú szerződés 1. számú módosítása


Melléklet: 5 db Szerződés

Kérem a szerződés 1 db eredeti aláírt példányát az aláírást követően a BKF részére visszajuttatni!

Kérem a mellékelt szerződést szignálni, illetve aláírni.

Dátum	Aláírás
dr. Olajos Orsolya (előkészítő) jogász, szignálásra)	2015.07.15
..... (eljárás (köz)beszerzője, szignálásra)
HARTAL ISTVÁN (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.07.21
BÁLINT ESZTER (szakterületi képviselő, szignálásra)	2015.07.20
dr. Sas Attila (jogi igazgató/helyettese, szignálásra)	2015 JGL 27.
BUDAY ANITA (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.07.23
GÁLL FERENC (gazdasági igazgatóság képviselője, szignálásra)	2015.07.22
HERVATI FERENC (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.07.30
NYUL ZOLTÁN (Aláírásra jogosult, aláírásra)	2015.07.29
.....

Megjegyzés:


 Egri Zoltán
